

# **Audit „Interneti juurdepääsuvõrkude rajamise tulemuslikkus“**

**Toomas Viira, auditijuht  
09.02.2022**

## Taust

- Lairiba baasvõrgu arendamine (2007–2020).
- Paigaldati 6273 km optilisi kaableid ja loodi 2510 võrguühenduskohta.
- Kogumaksumus 70,6 miljonit eurot (sellest saadud toetusi 60,8 miljonit eurot).



## Eelmine audit „Lairibavõrgu ehk kiire interneti väljaehitamise tulemuslikkus“ – 2015

- Riigikontrolli arvates on riigi selge tegevuskava puudumise tõttu ka aastaks 2020 keeruline teha kiire internet kättesaadavaks kõigile Eesti inimestele.
- Riik on kiire ja ülikiire interneti arendamiseks eelkõige investeerinud lairiba baasvõrgu ehitamisse ning jätnud tähelepanuta kiire ja ülikiire interneti kättesaadavaks tegemise kodudele ja asutustele.
- Riigil puudub plaan, kuidas viia kiire internet rajatud lairiba baasvõrgust edasi lõpptarbijani.


# Audit „Interneti juurdepääsuvõrkude rajamise tulemuslikkus“ – 2022

Anda hinnang,

- kas riigil on olemas plaan kiire interneti juurdepääsuvõrgu ehitamise toetamiseks turutõrkepiirkondades;
- kas riigi toetusmeetmed täidavad oma eesmärgi;
- kas lõppkasutajad kasutavad välja ehitatud kiire interneti ühendusi.



# Kiire interneti jõudmine lõppkasutajani lairiba juurdepääsuvõrgu esimeses etapis

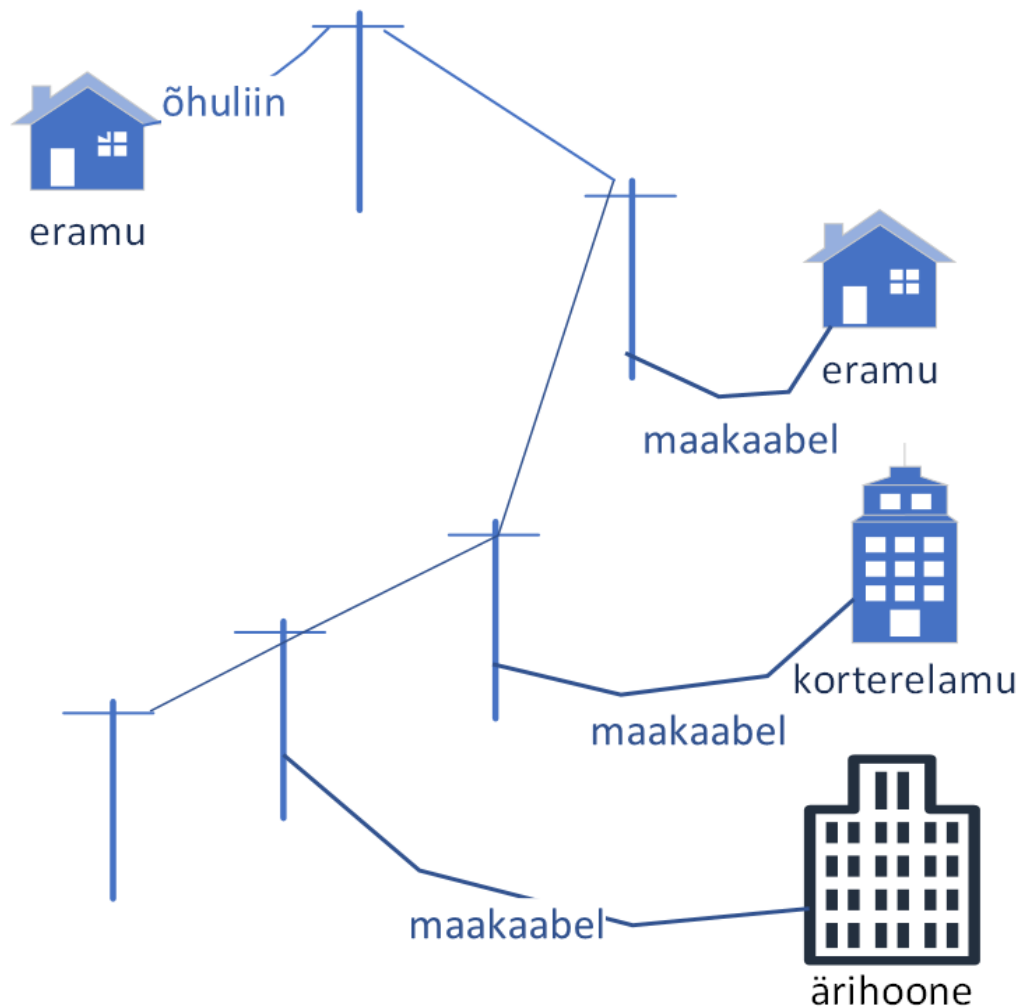

## Hinnangu andmise kriteeriumid

- MKMil on pikaajaline ja realistlik plaan kiire interneti juurdepääsuvõrgu valmis ehitamise toetamiseks turutõrkepiirkondades.
- Kiire interneti juurdepääsuvõrgu rajamiseks loodud toetusmeetmed on täitnud oma eesmärgi kiire interneti viimisel lõppkasutajateni.
- Lõppkasutajad kasutavad välja ehitatud juurdepääsuvõrgu kaudu kiiret interneti.

## Auditi peamised järeldused 1(3)

- Vaatamata MKMi eraldatud 35 miljonile eurole ja erinevatele meetmetele ei ole kiire interneti kättesaadavus turutõrkepiirkondades märkimisväärselt paranenud.
- Ülikiire interneti jõudmine kõigi vajajateni on algselt 2015. aastalt nihkunud esialgu 2020. aastale ja nüüdseks juba aastale 2030.
- MKMi senine poliitika ehitada sooviavaldusi arvestamata võimalikult odavalt võimalikult palju kiire interneti juurdepääsuühendusi ei ole raha tõhus kasutus.

## Auditi peamised järeldused 2(3)

- MKMil ega TTJA-l ei ole kiire interneti sooviavalduste kohta infot.
- MKMil ei ole teada, kui palju on selliseid majapidamisi, kus puudub kaabli kaudu interneti püsiühendus ja kus ka mobiilsidevõrgu levi ei ole või see on vilets.
- Internetiteenusega liitujate osakaal on väga väike (21%).
- MKM ja TTJA on turutõrkepiirkonnas asuva 200 000 aadressiobjekti hulka arvanud objekte, kuhu interneti juurdepääsuvõrku ei ole vaja.

## Auditi peamised järeldused 3(3)

- Praeguse ehitustempo juures kuluks üle 10 aasta, et ehitada turutõrkepiirkondades MKMi määratud aadressiobjektideni kiire interneti juurdepääsuühendus.
- 2021–2027 on plaanis juurdepääsuvõrgu ühenduste ehitamiseks kasutada 69 miljonit eurot. See võimaldaks MKMi hinnangul valmis ehitada ligikaudu 27 000 ühendust.
- Inimestel ei ole võimalik teada saada, kas ja millal kiire interneti juurdepääsuvõrk võiks jõuda nende külle või majapidamiseni, kui just nende majapidamine ei ole jooksva aasta ehitusplaanides.

## Soovitused ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministrile 1(2)

- Koostada pikaajaline realistlik plaan, kuidas jõuda kiire interneti ühenduseta majapidamisteni ja arengukavas „Eesti digiühiskond 2030“ püstitatud eesmärkide täitmiseni.
- Määrata kindlaks selged prioriteedid lairiba juurdepääsuvõrgu ehituse toetamiseks turutõrkepiirkondades.
- Planeerida ja ehitada juurdepääsuvõrke esmajärjekorras piirkondadesse ja/või majapidamistesse, mille elanikud on avaldanud soovi saada kiire interneti juurdepääsuühendus.

## Soovitused ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministrile 2(2)

- Määrata plaanis kindlaks väljaehitatavad ühendused piirkondade kaupa, nii et Eesti elanikel ja ettevõtetel oleks võimalik teada, kas ja millal nad saavad riigi toel ülikiiret internetiühendust kasutama hakata.
- Koguda juurdepääsuvõrkude senisest tulemuslikumaks planeerimiseks ja ehitamiseks kokku info kiire interneti juurdepääsuühenduseks soovi avaldanud majapidamiste kohta.
- Selgitada välja aadressiobjektid, kus puudub kaabli kaudu interneti püsiühendus ja kus ka mobiilsidevõrgu levi ei ole või see on vilets. Töötada välja nende ühendamiseks sobivad tehnilised lahendused ja toetusmeetmed.

## Soovitused TTJA peadirektorile

- Muuta turutõrkepiirkondade kaardistamise andmed kvaliteetsemaks.
- Teha MKMi määratud sagedusega kindlaks ja kanda netikaardile andmed turutõrkepiirkondades asuvate aadressiobjektide kohta.
- Arvestada laekunud sooviavaldustega s.t ehitada esmajärjekorras piirkondadesse, kust on enam laekunud sooviavaldusi saada kiire interneti juurdepääsuühendus.
- Parandada potentsiaalsete kiire interneti juurdepääsuvõrguga liitujate teavitamist.
